Vorgangsname	Dauer [Tag]	F-Beginn [Tag]	F-Ende [Tag]
BAUZEITPLAN			
ABSCHNITT A			
Baustelle einrichten	2	11.09.2023	12.09.2023
Erdarbeiten / Geländeregulierung	5	18.09.2023	22.09.2023
Drainage- Kanalarbeiten	9	20.09.2023	02.10.2023
Straßenbauarbeiten	10	03.10.2023	16.10.2023
Asphaltierungsarbeiten / STRASSENSPERRE	2	17.10.2023	18.10.2023
Bankette / Nebenflächen	3	19.10.2023	23.10.2023
Baustelle räumen / Restarbeiten	5	06.11.2023	10.11.2023
ABSCHNITT B			
Baustelle einrichten	2	11.09.2023	12.09.2023
Erdarbeiten / Geländeregulierung	5	18.09.2023	22.09.2023
Drainage- Kanalarbeiten	25	02.10.2023	03.11.2023
Asphaltprovisorium	2	06.11.2023	07.11.2023
Bankette / Nebenflächen	3	08.11.2023	10.11.2023
Baustelle räumen / Restarbeiten	5	06.11.2023	10.11.2023
ABSCHNITT C			
Baustelle einrichten	2	11.09.2023	12.09.2023
Sanierung Rohrdurchlass + Becken	5	13.09.2023	19.09.2023
Sanierung Kanalleitung und Schächte	5	13.09.2023	19.09.2023
Asphaltierungsarbeiten / STRASSENSPERRE	2	19.10.2023	20.10.2023
Baustelle räumen / Restarbeiten	5	30.10.2023	03.11.2023
Bautätigkeiten in ABSCHNITT A, B, C	45	11.09.2023	10.11.2023

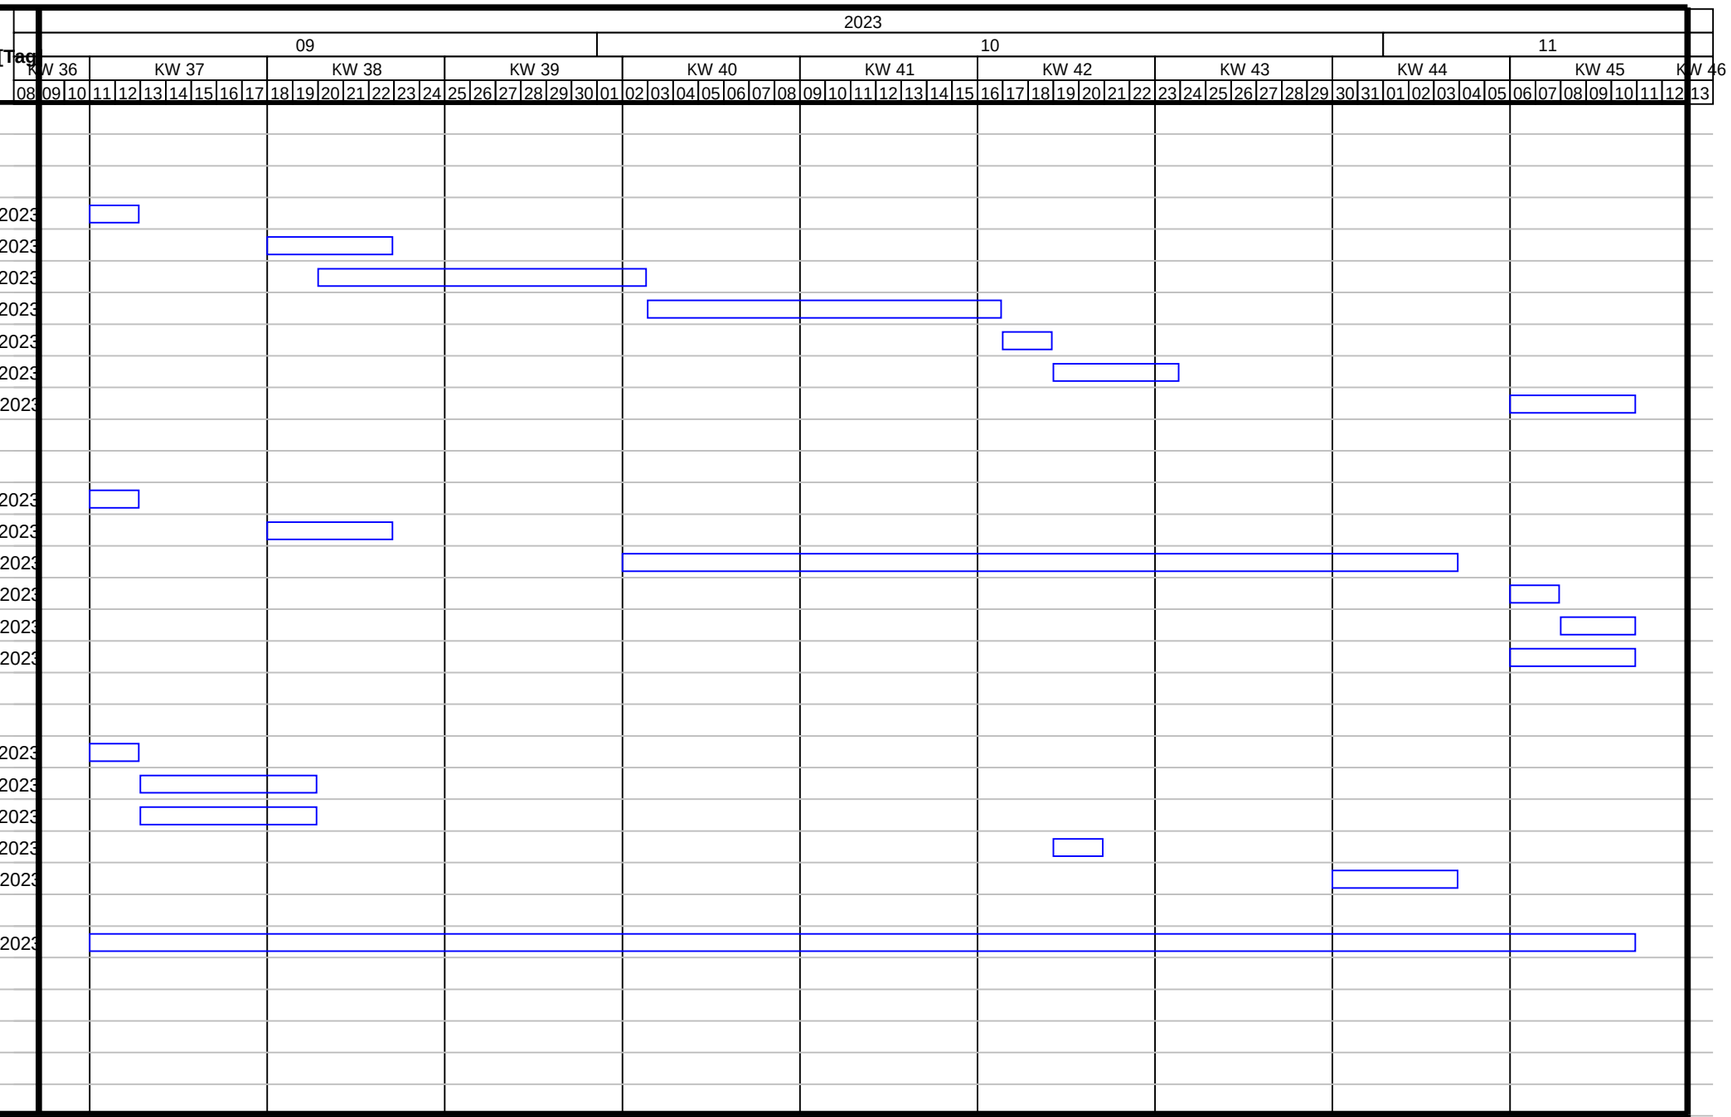

Projekt : Güterwegsanierung Plattenkogel

Plannummer: Plandatum:

Vorgang Fortschritt Sammelvorgang

Meilenstein Unterbrechung

Gedruckt mit AUER Success 7.02 - Lizenz CD066EAF-3551-4EF9-8750-AFE8FE2273
